

# Suivi d'exécution du contrat

Réviser les prix selon la formule du contrat, chiffrer les amendes de retard, suivre les modifications et évaluer le fournisseur.

Habitat Val de Meuse (organisme fictif) · contrat C-2024-05 · rapport généré le 13/10/2026

1,033

**Coefficient de révision**  
dernier mois, 3,3 % vs prix initial

225702 €

**Montant révisé facturé**  
3702 € de révision

2282 €


**Amendes de retard**  
plafond 16 650 €

11,8 %

**Modifications cumulées**  
au-delà du seuil : à vérifier

## Révision de prix

Formule  $p = P \times (0,20 + 0,50 \times s/s_0 + 0,30 \times l/l_0)$  appliquée mois par mois,

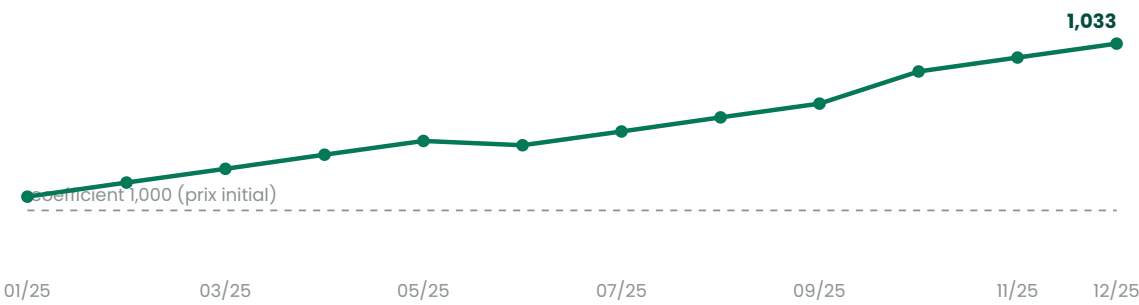


## Amendes de retard

Taux 0,07 % par jour sur le montant concerné, plafonné à 7,5 % du montant initial (paramètres du cahier des charges).

| Prestation           | Prévu      | Réel       | Jours de retard | Amende |
|----------------------|------------|------------|-----------------|--------|
| Phase 1 – bâtiment A | 31/03/2025 | 18/04/2025 | 18              | 680 €  |
| Phase 2 – bâtiment B | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 0               | 0 €    |
| Phase 3 – bâtiment C | 30/09/2025 | 07/11/2025 | 38              | 1543 € |
| Retouches            | 15/12/2025 | 22/12/2025 | 7               | 59 €   |


## Modifications du marché

**À vérifier** Cumul de 11,8 % du montant initial, au-delà du seuil paramétré de 10 %.



## Évaluation du fournisseur

Couleurs Mosanes SRL — moyenne 3,5/5.

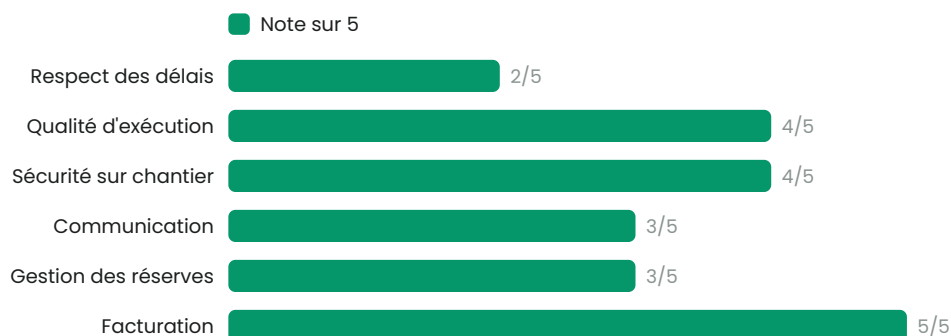

Outil d'aide à la gestion. Les signaux « à vérifier » découlent de règles paramétrables et ne constituent pas un avis juridique. Seuils et délais : onglet Paramètres du fichier source.
